

SG SYSTEMTECHNIK**Bully Les Mines Str.5 Ecke Alfred Nobel****Elsdorf****50189****NRW****Deutschland**

Telefon: 02274 700 852

Fax: 02274 700 851

E-Mail: post@SG-Systemtechnik.de

Reporter: G.Leonhardt



Berichtstil

Raw Protocol Report

Projekt Info

Projekt
 Job MIETE AUSHUB
 Erster Zugriff 16.05.2019 - 10:04:19
 Letzter Zugriff 16.05.2019 - 10:09:39
 Volumeneinheiten m³
 Flächeneinheiten m²
 Entfernungseinheiten Meter

Berechnetes Volumen

Name Volume1
 Urgelände
 Anzahl Punkte der Umrandung 15
 Anzahl Punkte der Oberfläche 26
 Typ Halde

GPS Details

Koordinatensystem UTM32_8_NHN.lok

Oberflächen Details

Oberfläche

Punkte der Umrandung

Punkt Nr	Osten	Norden	Höhe	KQ Position 3D
1	32344428.084	5681345.919	38.255	0.031
2	32344427.432	5681343.859	38.161	0.015
3	32344427.592	5681341.554	37.964	0.015
4	32344427.944	5681339.057	37.953	0.019
5	32344428.403	5681337.447	38.119	0.016
6	32344429.321	5681336.163	38.172	0.015
7	32344430.782	5681336.291	38.199	0.020
8	32344432.613	5681336.368	38.182	0.024
9	32344433.959	5681337.190	38.216	0.023
10	32344435.020	5681339.242	38.190	0.020
11	32344434.927	5681341.678	38.179	0.019
12	32344434.123	5681343.714	38.220	0.019
13	32344433.333	5681345.477	38.217	0.024
14	32344432.020	5681346.946	38.154	0.032
15	32344429.610	5681346.886	38.083	0.046

Oberflächenpunkte

Punkt Nr	Osten	Norden	Höhe	KQ Position 3D
1	32344428.084	5681345.919	38.255	0.031
2	32344427.432	5681343.859	38.161	0.015



Understanding construction.

3	32344427.592	5681341.554	37.964	0.015
4	32344427.944	5681339.057	37.953	0.019
5	32344428.403	5681337.447	38.119	0.016
6	32344429.321	5681336.163	38.172	0.015
7	32344430.782	5681336.291	38.199	0.020
8	32344432.613	5681336.368	38.182	0.024
9	32344433.959	5681337.190	38.216	0.023
10	32344435.020	5681339.242	38.190	0.020
11	32344434.927	5681341.678	38.179	0.019
12	32344434.123	5681343.714	38.220	0.019
13	32344433.333	5681345.477	38.217	0.024
14	32344432.020	5681346.946	38.154	0.032
15	32344429.610	5681346.886	38.083	0.046
16	32344431.224	5681339.077	40.155	0.016
17	32344431.021	5681340.448	40.231	0.015
18	32344430.418	5681341.630	40.215	0.017
19	32344430.415	5681343.171	40.156	0.017
20	32344430.622	5681344.334	40.094	0.016
21	32344431.779	5681343.095	40.039	0.016
22	32344432.185	5681341.957	40.165	0.014
23	32344432.674	5681340.318	40.156	0.015
24	32344431.750	5681340.226	40.252	0.014
25	32344431.443	5681341.692	40.220	0.013
26	32344431.094	5681342.865	40.172	0.013


Berechnungsergebnisse

Urgelände


Umfang	30.178
Fläche	78.962
Max. Höhe	40.252
Min. Höhe	37.953
Mittl. Flächenhöhe	39.113

Gesamtergebniss

Berechnetes Volumen	65.124(Abtrag)
Quellfaktor	1.000
Korrigiertes Volumen	65.124(Abtrag)



Understanding construction.

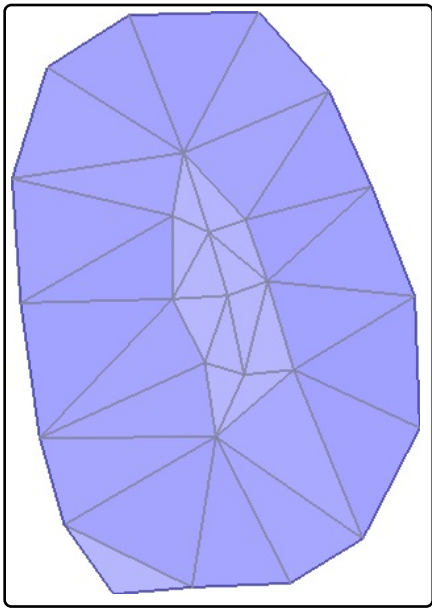

Understanding construction.
